



EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEGLI IMPIANTI

<i>Comune di</i>	SETTIMO TORINESE
<i>Perimetro di gestione IP</i>	8.310 punti luce
<i>Perimetro di gestione IS</i>	218 lanterne semaforiche e segnali luminosi
<i>Tipologia di contratto</i>	Contratto Esteso per 9 anni
<i>Avvio del Servizio</i>	01 maggio 2017
<i>Relazione annuale</i>	Anno gestionale 2024

INDICE


1. Premessa.....	3
2. Consumi energetici con dettaglio mensile e suddivisione per punto di consegna.....	3
2.1 RISPARMIO ENERGETICO.....	4
3. Situazioni di non conformità funzionale e normativa evidenziate nella documentazione progettuale.....	4
4. Descrizione degli interventi previsti ed effettuati sul territorio comunale.....	4
4.1 INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	5
4.2 INTERVENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI.....	5
4.3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.....	5
4.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	7
4.5 ISPEZIONI NOTTURNE ESEGUITE.....	9
5. Non conformità rilevate sul territorio.....	9
5.1 REGOLARIZZAZIONE DEI CARICHI ESOGENI STATICI ED ELETTRICI.....	10
6. Allegati.....	11

1 **PREMESSA**

La presente relazione annuale, per come disciplinato al **paragrafo 4.3.1.5 Capitolato Tecnico della Convenzione Consip "Servizio luce 3"** riporta gli esiti delle attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli impianti, delle condizioni di sicurezza e dell'adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica svolte nel corso dell'anno.

2 **CONSUMI ENERGETICI CON DETTAGLIO MENSILE E SUDDIVISIONE PER PUNTO DI CONSEGNA**

Nel corso del 2024, da gennaio a dicembre, per l'illuminazione pubblica sono stati consumati circa 1,563 GWh (GigaWattora) di energia elettrica prelevata dai punti di consegna in carico a Edison Next Government srl con un consumo globale dall'inizio del contratto pari a circa 17,09 GWh con una spesa corrente complessiva per l'anno 2024

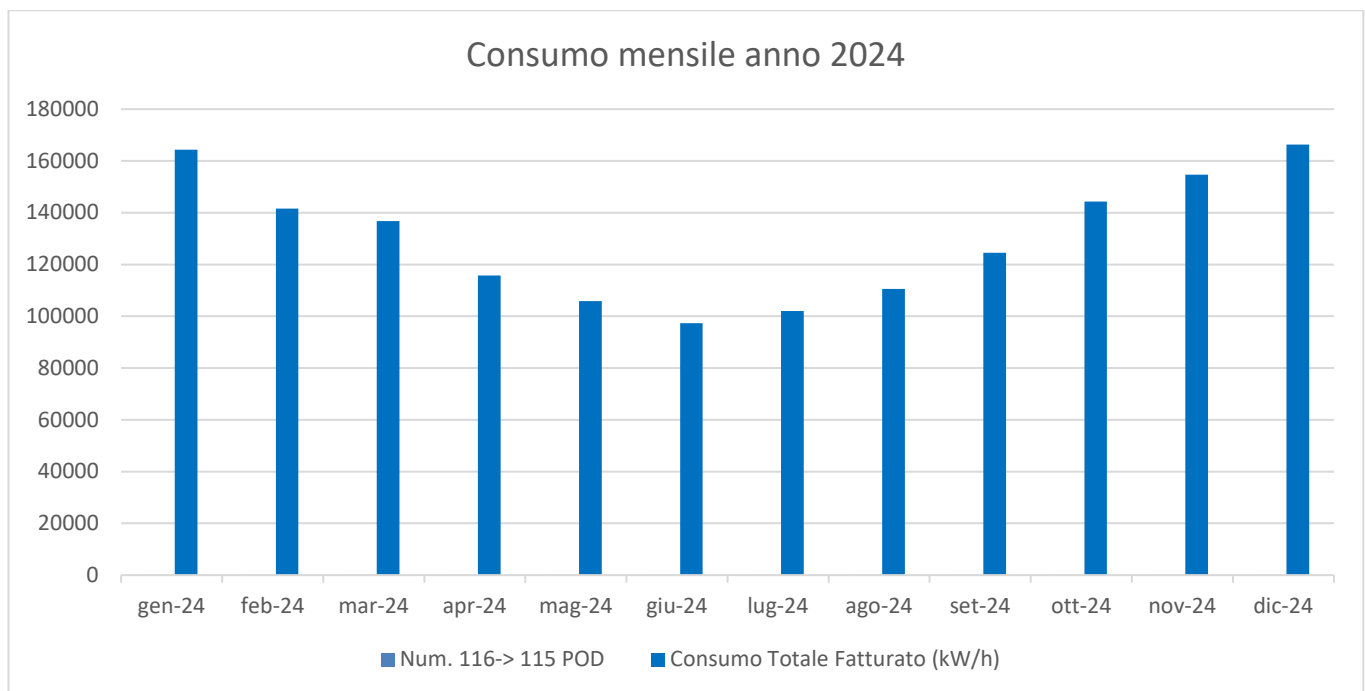

TOTALE CONSUMO ANNUO DEI 116 POD: 1.563.839 kW/h

Per il dettaglio dei consumi mensili suddivisi per punto di consegna si rimanda alla tabella allegata alla presente relazione e parte integrante della stessa. Ad ottobre come da Vs richiesta abbiamo provveduto a dare disdetta al POD IT001E02542711 di via S. Cristina parcheggio ospedale Asl.

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

2.1 RISPARMIO ENERGETICO

Nella tabella sottostante si raffronta il *risparmio energetico* per la norma UNI EN11352 conseguito sino al termine dell'anno in corso.

Consumo stato di fatto da PDI	5.468.188	kWh	A
Consumo stato di progetto da PDI	2.065.050	kWh	B
Risparmio minimo garantito	62%		(A-B)/A
Consumo registrato nel 2024	1.563.839	kWh	C
Risparmio conseguito nel 2024	71%		(A-C)/A

Come si può notare il risultato ottenuto, va oltre a quanto previsto in fase di offerta da PDI, segnale di una ottima efficienza dei vari impianti IP riqualificati a led e il completamento di alcuni punti luce che ancora mancavano.

3 SITUAZIONI DI NON CONFORMITÀ FUNZIONALE E NORMATIVA EVIDENZIATE NELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE.

Le analisi delle informazioni rilevate a seguito delle verifiche eseguite, e dagli interventi di manutenzione eseguiti sugli impianti hanno permesso di identificare:

- situazioni di non conformità, con riferimento allo stato funzionale, alle condizioni di sicurezza degli impianti e allo stato di adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica;
- le loro cause (es. presenza di guasti difficilmente riscontrabili, correnti di dispersione, carichi esogeni di tipo meccanico; presenza di alberi, progettazione non corrispondente alle situazioni);

Sulla base delle analisi sopra evidenziate e a seguito della relazione dei controlli di stabilità del 2022 sono stati eseguiti e completati interventi correttivi relativi a:

- ✓ messa in sicurezza dei pali IP con la sostituzione dei sostegni ammalorati con nuovi sostegni.

4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI ED EFFETTUATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Per la risoluzione delle anomalie durante le varie attività di manutenzione e verifiche, si riportano gli interventi eseguiti nel corso del 2024.

Le tabelle sottostanti suddivise per tipologia riportano le attività e gli interventi eseguiti.

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

4.1 INTERVENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE	ELEMENTI PRESENTI SUL TERRITORIO	ELEMENTI SOGGETTI AD INTERVENTO	ELEMENTI SOSTITUITI
APPARECCHI	n. 8.310 corpi illuminati censiti sul territorio	n. 7.307 corpi illuminanti da riqualificare previsti nell'Allegato B di offerta	Sino al termine dell'anno 2024 sono stati riqualificati circa il 99,5 % degli apparecchi previsti in offerta. Rimangono ancora un ventina di faretti non a led da sostituire e 6 lampioni ornamentali in via Sales che saranno pianificati ad inizio 2025
SOSTEGNI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IP	n. 7.091 sostegni inclusi sbracci a palo e a muro censiti sul territorio	189 +243 sostegni e/o sbracci di vario tipo ed altezza da riqualificare previsti nell'Allegato B di offerta a carico dell'Amministrazione e del Fornitore (Edison Next Government srl)	nel corso del 2024 sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione di n.49+64 pali IP a seguito controllo stabilità del 2022 e eseguiti interventi di manut. straordinaria secondo offerte presentate ed autorizzate da Patrimonio Settimo. Interventi di rimozione e sostituzioni sostegni causa sinistri.
QUADRI ELETTRICI	n. 120 censiti sul territorio comprese le ulteriori integrazioni	n. 18 quadri elettrici previsti nell'Allegato B di offerta di cui: - 8 per adeguamento normativo - 10 di nuova fornitura	nel corso del 2024 sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria su vari impianti a seguito di offerte presentate ed autorizzate da Patrimonio Settimo per materiale per guasti. Sostituito e spostato QE in via Fantina per cantiere nuova scuola

4.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI SEMAFORICI IS

DESCRIZIONE	ELEMENTI PRESENTI SUL TERRITORIO	ELEMENTI SOGGETTI AD INTERVENTO	ELEMENTI SOSTITUITI
LANTERNE SEMAFORICHE	n. 218 lanterne semaforiche e/o segnali luminosi censiti sul territorio	n. 95 lanterne semaforiche da riqualificare previste nell'Allegato B di offerta	I lavori di riqualifica sono stati completati ed ultimati nel corso del 2019
PALINE SEMAFORICHE	n. 132 sostegni	non sono previste sostituzioni	Nel corso del 2024 sono stati fatti i controlli sugli impianti di terra delle centraline semaforiche come da report in vs possesso Eseguiti interventi su impianti semaforici causa guasti o materiale obsoleto.
REGOLATORI SEMAFORICI	n. 18 regolatori semaforici	non sono previste sostituzioni	

4.3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

Nella tabella sotto sono riportate tutte le segnalazioni pervenute al nostro call-center, compreso la componente semaforica, nel corso del 2024.

MESE	CODICE VERDE IP	CODICE GIALLO IP	CODICE ROSSO IP	CODICE ROSSO IS	TOT RICHIESTE
GEN	6	2	2	5	15
FEB	4	6	4	13	27
MAR	15	4	5	8	32
APR	3	1	5	3	12
MAG	3	5	2	10	20
GIU	5	1	8	5	19
LUG	12	2	10	8	32
AGO	29	6	1	6	42
SET	15	7	8	10	40
OTT	13	3	10	6	32
NOV	17	1	4	16	38
DIC	15	2	4	3	24
TOT RICHIESTE	137	40	63	93	333


4.4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

A conclusione dell'anno 2024, a seguito degli interventi effettuati di manutenzione straordinaria, la contabilità di commessa presenta i risultati come da tabella sotto riportata, del quale file excel trasmessovi via mail in data 20.12.2024

DETTAGLIO LAVORI IN EXTRACANONE e CANONE AUTORIZZATI E COMPLETATI

CONSIP S.p.A.


Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

								Patrimonio Città di Settimo Torinese srl			
EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l.								Ufficio Tecnico			
								c.a. Arch. Sala Marco			
								c.a. Sig. Forti Giuseppe			
TORINO li,		30 dicembre 2024						c.a. Sig.ra Rosetta Curello			
Oggetto:		RIEPILOGO SITUAZIONE LAVORI AGGIORNAMENTO AL 30 DICEMBRE 2024									
Di seguito si riporta la situazione aggiornata dei lavori sinora eseguiti e la loro situazione contabile											
OFFERTA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	AUTORIZZATE		COMPLETATE		DA SALDARE					
		Si/No	Data	Si/No	Importo EDISON NEXT	Si/No	Importo senza IVA	Importo con IVA			
DETTAGLIO LAVORI IN EXTRACANONE AUTORIZZATI E COMPLETATI											
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2019					€	131.485,91		€	131.485,91	€	160.412,81
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2020					€	14.019,29		€	14.019,29	€	17.103,53
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2021					€	3.681,86		€	3.681,86	€	4.491,87
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2022					€	12.410,04		€	12.410,04	€	15.140,25
ANNO 2023											
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2023					€	23.147,54		€	23.147,54	€	28.240,00
TOTALE GENERALE PER LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI					€	332.570,93		€	332.570,93	€	405.736,53
SPECCHIETTO RIASSUNTIVO LAVORI											
						COMPLETATE	DA SALDARE				
						<i>Importo Citelum</i>	<i>Importo senza IVA</i>	<i>Importo con IVA</i>			
IMPORTO QUOTA LAVORI EXTRACANONE PREVISTO IN PDI					€	332.570,93					
TOTALE GENERALE - LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI					€	332.570,93		€	332.570,93	€	405.736,53
TOTALE GENERALE - LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI PER SINISTRI											
IMPORTO A DISPOSIZIONE COME LAVORI EXTRACANONE					€	-		€	-	€	-
DETTAGLIO LAVORI A CANONE (A CURA DEL FORNITORE) AUTORIZZATI E COMPLETATI											
DETTAGLIO LAVORI PREVISTI NEL PDI											
SE_01	Lanterne Semaforiche				€	76.000,00					
VOCE MS_03	Sostituzione Sostegni/sbracci				€	69.838,00					
VOCE AT_01	Installazione Sistema di TLC				€	119.015,52					
TOTALE LAVORI PREVISTI A CANONE					€	264.853,52		€	-	€	323.121,29
LAVORI A CANONE AUTORIZZATI E COMPLETATI											
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2019					€	76.000,00		€	76.000,00	€	92.720,00
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2021					€	51.473,52		€	51.473,52	€	62.797,69
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2022					€	79.005,88		€	79.005,88	€	96.387,17
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2023					€	11.434,82		€	11.434,82	€	13.950,48
Mdp 012_22_ST	Offerta IP Via Consolata	SI	email 08.09.22	SI	€	1.077,01	SI	€	1.077,01	€	1.313,95
PA 002_24_ST	Preventivo sostituzione scheda madre su impianto I.S. C.so Agnelli-Via Cuneo (rif. segnalaz. 136154)	SI	email 19.02.24	SI	€	541,76	SI	€	541,76	€	660,95
PA 003_24_ST	Consuntivo sostituzione scheda madre su impianto I.S. C.so Regio Parco-Via Sanzio (rif. segnalaz. 136770) a seguito urto di veicolo ignoto su colonnina contatore	SI	email 10.04.24	SI	€	597,98	SI	€	597,98	€	729,54
PA 004_24_ST	Preventivo per sostituzione e spostamento QE via Fantina e contatori Enel x cantiere	SI	email 18.06.24	SI	€	7.519,21	SI	€	7.519,21	€	9.173,44
PA 007_24_ST	Consuntivo sostituzione schede elettroniche su centralina IS viale Piave-via Nobel (segn 140100)	SI		SI	€	1.675,96	SI	€	1.675,96	€	2.044,67
PA 009_24_ST	Consuntivo sostituzione scheda madre su impianto IS C.so Agnelli-Via Cuneo (segn 141705)	SI		SI	€	541,76	SI	€	541,76	€	660,95
PA 011_24_ST	Consuntivo sostituzione tratto di linea elettrica torre TF 493 str.Cebrosa-via Leini.	SI	email 17.06.24	SI	€	2.763,83	SI	€	2.763,83	€	3.371,87
PA 014_24_ST	Consuntivo ricerca guasto e sostituzione tratto linea villaggio Olimpia (Segn.142869)	SI		SI	€	1.463,42	SI	€	1.463,42	€	1.785,37
PA 015_24_ST	Consuntivo sostituzione scheda madre su impianto IS corso Piemonte-via di Vittorio (segn 144313)	SI		SI	€	541,76	SI	€	541,76	€	660,95
PA 016_24_ST	Consuntivo sostit tratto di linea alimentazione IP in via Mulino Vecchio tranciata da scavo di terzi (Segn 145325)	SI		SI	€	754,67	SI	€	754,67	€	920,70
PA 021_24_ST	Preventivo fornitura e posa tratto di linea IP in str. delle Sorgenti per sostituzione ponte sul rio, previo sfilaggio della linea attuale.	SI	email 09.12.24	SI	€	568,08	SI	€	568,08	€	693,06
SUB TOTALE LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI ANNO 2024					€	18.045,44		€	18.045,44	€	22.015,44
TOTALE GENERALE CANONE PER LAVORI ESEGUITI E COMPLETATI					€	235.959,66		€	235.959,66	€	287.870,79
IMPORTO A DISPOSIZIONE A CANONE COME LAVORI EXTRA					€	28.893,86		€	28.893,86	€	35.250,51

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000


DETTAGLIO LAVORI PER SINISTRI AUTORIZZATI E COMPLETATI, DEI QUALI SONO STATI PAGATI UNA PARTE PER IMPORTO PARI A 14.500,98€

		Patrimonio Città di Settimo Torinese srl Ufficio Tecnico c.a. Arch. Sala Marco c.a. Sig. Forti Giuseppe c.a. Sig.ra Rosetta Currello						
		EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l. Torino li, 30 dicembre 2024						
Oggetto: RIPILOGO SITUAZIONE LAVORI AGGIORNAMENTO AL 19 DICEMBRE 2024		Di seguito si riporta la situazione aggiornata delle offerte sinora presentate e la loro situazione						
OFFERTA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	AUTORIZZATE		COMPLETATE		DA SALDARE		
		Si/No	Data	Si/No	Importo EDISON NEXT	Si/No	Importo senza IVA	Importo con IVA
DETTAGLIO LAVORI SINISTRI								
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2018					7.486,57 €		€ 7.486,57	€ 9.133,62
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2019					6.460,02 €		€ 4.461,79	€ 5.443,38
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2020					11.941,34 €		€ 1.171,28	€ 1.428,96
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2021					4.497,97 €		€ 3.265,34	€ 3.983,71
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2022					11.572,81 €		€ 8.570,00	€ 10.455,40
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2023					19.501,85 €		19.501,85 €	18.212,33 €
PA 005_24_ST	Preventivo per sostituz palo IP via Paganini raccordo A4 urtato da ignoti	NO	In attesa	NO	€ 1.080,48		€ 1.080,48	€ 1.318,19
PA 006_24_ST	Consuntivo intervento di ripristino cavo aereo in via Alpi Graie percorso pedonale vicino ferrovia (rif. segnalazione 139949)	SI	Mail del 23.04.2024	SI	€ 825,64		€ 825,64	€ 1.007,28
PA 008_24_ST	Preventivo per sostituzione palo IP via Regio Parco ingresso rotonda urtato da ignoti	SI	Mail del 25.09.2024	SI	€ 1.053,81		€ 1.053,81	€ 1.285,65
PA 010_24_ST	Preventivo per sostituz palo IP via Cebrosa civ 26 (Segn 141116)	NO	In attesa	NO	€ 953,04		€ 953,04	€ 1.162,71
PA 013_24_ST	Preventivo per sostituzione palo IP via Regio Parco 63 urtato da autobus Gtt (Segn 144019)	SI	Mail del 07.11.2024	SI	€ 957,02		€ 957,02	€ 1.167,56
PA 017_24_ST	Preventivo per sostituzione palo IP via Bergamo n.3 causa urto (segn.145291)	NO	In attesa	NO	€ 1.442,31		€ 1.442,31	€ 1.759,62
PA 018_24_ST	Preventivo per sostituzione palo IP in via Calabria n.1 causa urto di camion (segn.149466)	NO	In attesa	NO	€ 953,79		€ 953,79	€ 1.163,62
PA 019_24_ST	Preventivo per sostituzione palo IP in str. Borgata Paradiso sinistrato (segn.149494)	NO	In attesa	NO	€ 1.035,74		€ 1.035,74	€ 1.263,60
PA 020_24_ST	Preventivo per sostituzione palo IS e lanterna incrocio c.so Piemonte - via Monviso sinistrati (segn.150887)	SI	Mail del 18.12.2024	NO	€ 1.607,31		€ 1.607,31	€ 1.960,92
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2024					9.909,14 €		9.909,14 €	12.089,15 €
TOTALE GENERALE PER SINISTRI					71.369,70 €		€ 71.369,70	€ 87.071,03
TOTALE INTERVENTI SINISTRI - ESEGUITI					37.991,94 €		€ 37.991,94	€ 46.350,17
TOTALE INTERVENTI SINISTRI - DA ESEGUIRE					33.377,76 €		€ 33.377,76	€ 40.720,87

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

Inoltre, sono state presentate offerte per nuovi lavori in attesa di autorizzazione nel corso del 2024 come da tabella riportata.

		Patrimonio Città di Settimo Torinese srl						
EDISON NEXT GOVERNMENT S.r.l.		Ufficio Tecnico						
		c.a. Arch. Sala Marco						
		c.a. Sig. Forti Giuseppe						
Torino lì,	30 dicembre 2024	c.a. Sig.ra Rosetta Curello						
Oggetto:	RIEPILOGO SITUAZIONE LAVORI AGGIORNAMENTO AL 19 DICEMBRE 2024							
Di seguito si riporta la situazione aggiornata delle offerte sinora presentate e la loro situazione								
OFFERTA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	AUTORIZZATE		COMPLETATE		DA SALDARE		
		Si/No	Data	Si/No	Importo EDISON NEXT	Si/No	Importo senza IVA	Importo con IVA
DETTAGLIO OFFERTE IN EXTRACANONE DA AUTORIZZARE								
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2020					€ 87.960,85		€ 87.960,85	€ 107.312,24
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2021					€ 11.262,44		€ 11.262,44	€ 13.740,18
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2022					€ 52.805,43		€ 52.805,43	€ 64.422,62
PA/001_23_ST	OFFERTA PER SOSTITUZIONE N.2 LANTERNE+PULSANTI+AVVISI SONORI IS INCROCIO V.LE PIAVE-DALLA CHIESA	NO	email 10.02.23	NO	€ 2.941,44		€ 2.941,44	€ 3.588,56
PA/003_23_ST	RIMOZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA San Mauro incrocio via Vagliè	NO	email 24.02.23	NO	€ 1.505,20		€ 1.505,20	€ 1.836,34
PA/005_23_ST	Offerta adeguamento IS di Via Generale Chiesa/Castiglione con dispositivi per non vedenti e sostituzione delle 6 lanterne alte con tipologia a led	NO	email 24.02.23	NO	€ 16.675,16		€ 16.675,16	€ 20.343,70
PA 011_23_ST	Sostituzione lanterne su impianto I.S. C.so Regio Parco-via Sanzio (segnal 113997) in quanto crepate nell'involucro	NO	email del 04.05.23	NO	€ 3.817,12		€ 3.817,12	€ 4.656,89
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2023					€ 24.938,92		€ 24.938,92	€ 30.425,48
PA 012_24_ST	Preventivo sostituzione pali sbraccio I.S. c.so Agnelli-via San Mauro	NO		NO	€ 2.753,18		€ 2.753,18	€ 3.358,88
SUB TOTALE OFFERTE PRESENTATE ANNO 2024					€ 2.753,18		€ 2.753,18	€ 3.358,88
TOTALE GENERALE PER LAVORI DA ESEGUIRE					€ 179.720,82		€ 179.720,82	€ 219.259,40

Riassumendo la situazione complessiva al termine del 2024 è raffigurata nella seguente tabella:

SPECCHIETTO RIASSUNTIVO GENERALE - IMPORTI A RIMANENZA			
IMPORTO A DISPOSIZIONE COME LAVORI EXTRACANONE		€ -	€ -
IMPORTO A DISPOSIZIONE COME LAVORI A CANONE (A CURA FORNITORE)		€ 28.893,86	€ 28.893,86
IMPORTO SINISTRI AL NETTO DI FATTURAZIONE SPECIFICA COME RIMBORSO		-€ 23.066,75	-€ 23.066,75
IMPORTO A DISPOSIZIONE COME LAVORI EXTRACANONE		€ 5.827,11	€ 5.827,11

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

PER LA SOSTITUZIONE DEI SOSTEGNI AMMALORATI SECONDO RELAZIONE DI STABILITÀ PER I QUALI È STATO FATTO VS AFFIDAMENTO LAVORI PROT.90 DEL 02-04-2024, LA SITUAZIONE CONTABILE E' LA SEGUENTE

AFFIDAMENTO LAVORI PROT.90 DEL 02-04-2024 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALI IP A SEGUITO VERIFICHE DI STABILITA'								Agg. 30/12/24		
OFFERTA	DESCRIZIONE DEI LAVORI	AUTORIZZATE		COMPLETATE		DA SALDARE				
		SI/No	Data	SI/No	Importo EDISON NEXT	SI/No	Importo senza IVA	Importo con IVA		
Mdp 017_22_ST	OFFERTA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE SOSTEGNI OBSOLETI E SOSTITUZIONE CON EVIDENTI SEGNI DI CORROSIONE A SEGUITO DI VERIFICA TECNICA E EVIDENZIATE CON COMUNICAZIONI DI POSTA ELETTRONICA -	SI		SI	€ 29.438,00	NO	€ 29.438,00	€ 35.914,36	FATTURATO	
PA 009_23_ST	INTERVENTO DI RIMOZIONE n.49 PALI LUCE E SOSTITUZIONE CON QUELLI NUOVI A SEGUITO CONTROLLO STRUTTURALE ESEGUITO DALLA GLOBAL CORR (contabilizzata la sola rimozione)	SI		SI	€ 49.957,95	NO	€ 49.957,95	€ 60.948,70	FATTURATO	
PA 001_24_ST	OFFERTA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE N.64 PALI LUCE E SOSTITUZIONE CON QUELLI NUOVI A SEGUITO CONTROLLO STRUTTURALE INDICATI DA SOSTITUIRE A 12 MESI	SI		Manca la rimozione di 6 p.l.in via Ticino e Pavia e il ribalmento linea aerea sotto i nuovi posati	€ 64.011,73	SI	€ 64.011,73	€ 78.094,31	DA FATTURARE	
Totale					€ 143.407,68		€ 64.011,73	€ 78.094,31		

4.5 ISPEZIONI NOTTURNE ESEGUITE

Nel corso del 2024 sono state eseguite le ispezioni notturne così come previsto dal CSA di Consip.

5 NON CONFORMITÀ RILEVATE SUL TERRITORIO.

Allo stato attuale non si evidenziano situazioni di non conformità se non quelle riportate nelle sezioni sotto.

Tuttavia, sono da ritenersi passibili di variazioni in quanto le verifiche annuali effettuate sugli impianti potranno dare riscontro ad interventi necessari e propedeutici alla rimozione di tali anomalie.

5.1 REGOLARIZZAZIONE DEI CARICHI ESOGENI STATICI ED ELETTRICI.

La presente sezione racchiude l'elenco dei carichi esogeni segnalati in fase di censimento, identificandone la tipologia (meccanica od elettrica).

All'esito dei sopralluoghi preliminarmente eseguiti sono stati identificati i seguenti carichi esogeni per i quali nel corso del contratto, vista la natura del carico e le implicazioni necessarie per la loro separazione, si provvederà alla risoluzione degli stessi.

Vista la natura dei carichi, non è stato individuato un elemento di rischio tale da pregiudicare il corretto funzionamento o la sicurezza sugli impianti ad essi connessi.

CONSIP S.p.A.

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ELENCO DEI CARICHI SOGGETTI INDIVIDUATI

Q. E.	POD	Via	Carico esogeno riscontrato
QE016	IT001E04270119	Via Luigi Einaudi	Alimentazione prese area mercatale

6 ALLEGATI

Gli allegati facente parte del seguente documento sono i seguenti:

- Tabella dei consumi energetici con dettaglio mensile suddiviso per singolo POD
- Scheda ispezioni notturne.
