Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO CANTIERE	280 g
Allestimento campo base	280 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
Allestimento cantiere aree per nuova viabilità e fognature	183 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
Allestimento cantiere per completamento piazzale Nuovo Palazzetto dello Sport	14 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
DISMISSIONE AMIANTO	5 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale	2 g
Rimozione di coperture in cemento amianto	1 g
Incapsulamento di coperture in cemento amianto	2 g
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	5 g
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici	4 g
Rimozione di manto di copertura in tegole	1 g
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici	1 g
STRUTTURE IN C.A.	209 g
STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE - MURO DI SOSTEGNO	33 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g
Impermeabilizzazione di pareti controterra	2 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g
BASAMENTO PER CABINA ELETTRICA	4 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	2 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g
STRUTTURE PREFABBRICATE (CABINA ELETTRICA)	3 g
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	3 g
STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE - BASAMENTO RECINZIONE PALAZZETTO	15 g
Scavo a sezione obbligata	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	10 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	10 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2 g
MOVIMENTO TERRA	164 g
PIAZZALE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	6 g
Scavo di sbancamento (per fondazione pavimentazione piazzale)	6 g
Formazione di rilevato stradale	6 g
NUOVA STRADA DI ACCESSO AL COMPLESSO	10 g
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2 g
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere	1 g
Scavo di splateamento	2 g
Scavo di sbancamento	2 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g
OPERE STRADALI - NUOVA STRADA DI ACCESSO AL COMPLESSO	39 g
Formazione di fondazione stradale e pista ciclopedonale	5 g
Formazione di manto di usura e collegamento	7 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	6 g
Realizzazione di marciapiedi	6 g
Posa di segnaletica verticale	2 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g
OPERE STRADALI - PAVIMENTAZIONE PIAZZALE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT	
Formazione di fondazione stradale	5 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte (aree verdi)	4 g
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g
OPERE DA FABBRO	6 g
Posa di recinzioni e cancellate	6 g
Posa di ringhiere e parapetti (muro di sostegno)	6 g
INVARIANZA IDRAULICA	8 g
Scavo a sezione ristretta	8 g
Scavo a sezione obbligata	8 g
Posa di geotessuto con funzione drenante e di separazione	8 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (per realizzazione troppo pieno)	1 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	8 g
FOGNATURA NERA	10 g
Scavo a sezione obbligata	10 g
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi	10 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	10 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	10 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	10 g
FOGNATURA BIANCA (PIAZZALE PALAZZETTO)	6 g
Scavo a sezione obbligata	6 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	6 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	6 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	6 g
FOGNATURA BIANCA (ACQUE STRADALI)	7 g
Scavo a sezione obbligata	7 g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	7 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	7 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina (parziale)	7 g
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	206 g
Scavo a sezione obbligata	18 g
Posa di conduttura elettrica	18 g
Posa di cavidotto	18 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	18 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	10 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	10 g
ACQUEDOTTO	2 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	2 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2 g
OPERE A VERDE	12 g
Messa a dimora di talee e piantine	9 g
Messa a dimora di piante	9 g
Semina a spaglio	3 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = CAMPO BASE	
Z2 = DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	
Z3 = DISMISSIONE AMIANTO	
Z4 = CABINA ELETTRICA	
Z5 = MURO DI SOSTEGNO	
Z6 = PIAZZALE PALAZZETTO	
Z7 = NUOVA VIABILIA'	

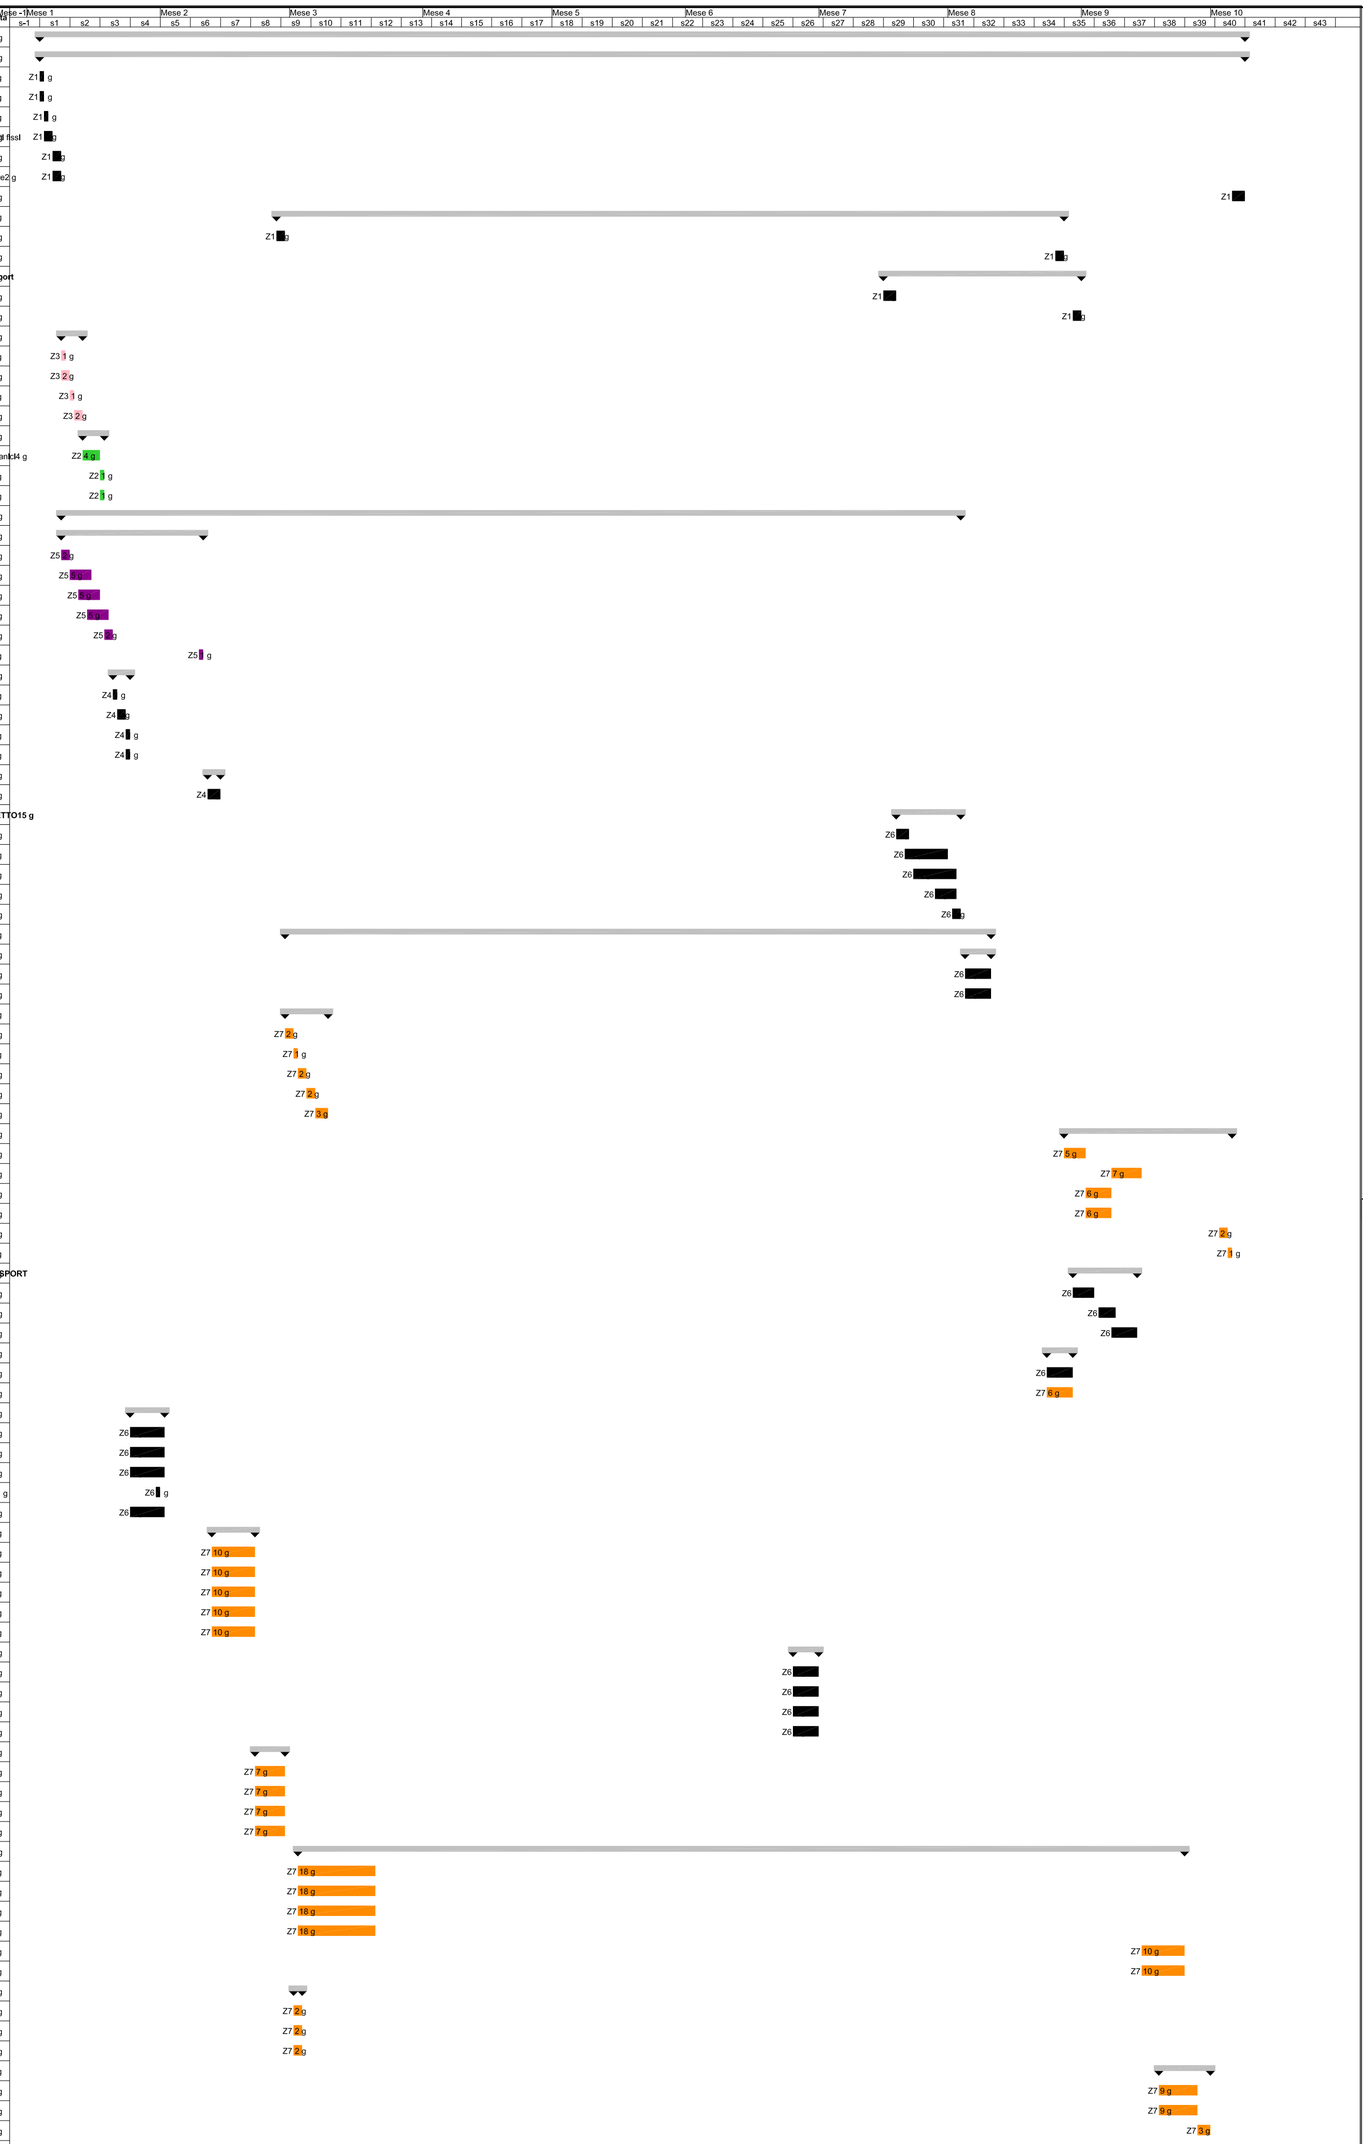

Città di Settimo Torinese
Citta metropolitana di Torino
Regione Piemonte

COMPLETAMENTO DELLE OPERE A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SPORTIVO

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. n. | Oggetto | Scala

SIC4 DIAGRAMMA DI GANTT -

SAT Per lo sviluppo locale
SAT s.c. a r.l. - p.zza della Libertà, 4 - 10036 Settimo T.se - Tel. 039-011 8028211

Rev. Agg.	Data	Descrizione	Redazione	Direttore Tecnico SAT: arch. Milena QUERCIA
00	novembre 2018	prima redazione	ex	Coordinamento progettuale SAT s.c. a r.l.: Ing. Nicoletta ALOTTO
				Progetto: GESTWS Engineering
Valutazione previsionale di impatto acustico: ing. Rosamaria MIRAGLINO				Relazione geologico - geotecnica: dott. geol. Secondo ACCOTTO

Dott. Ing. Alfredo CIVIDINO n. 4702 W

COD: 763-16	FN:763_SIC04-Gantt.dwg	RC: mq	RP: cm

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA L'AUTORIZZAZIONE ESPLICITA DI SAT s.c. a r.l. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI.
